

- 미 급수지역에 수도시설 확충을 통해 군민이 안심하고 마실 수 있는 깨끗한 상수도를 공급

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 일원(고현, 설천, 남, 서, 읍, 이동, 창선)
- 사업기간 : 2020.8. ~ 2023.12.(4년간)
- 사업내용 : 상수관로 매설 L=56.4km, 가압장 7개소
- 총사업비 : 13,532백만 원(도비 5,950, 군비 7,582)
- 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	사 업 비			비 고
		2020년	2021년	2022년이후	
계	13,532	1,900	3,400	8,232	
도 비	5,950	-	1,190	4,760	
군 비	7,582	1,900	2,210	3,472	

□ 추진상황 및 계획

- 2019. 7. : 도서지역식수원개발사업(남해도2) 기본 및 실시설계 착공
- 2020. 5. : 지방건설기술심의 등 행정절차 이행 완료
- 2020. 7. : 도서지역식수원개발사업(남해도2) 기본 및 실시설계 준공
(사업전환 → 남해군 농어촌생활용수개발사업)
- 2020.10. : 남해군 농어촌생활용수개발사업 발주
- 2020.12. : 총괄 및 1차분 착수 및 주민설명회 실시 예정
- 2023.12. : 사업완료 예정

□ 소요예산 : 3,400백만 원(도비 1,190, 군비 2,210)


□ 문제점 및 대책

- 균특 지방전환사업으로 전체 사업비 미확보
 - ⇒ 총 사업비 13,532백만 원 중 5,950백만 원 확보
 - ⇒ 추가 도비 확보를 위한 지속적인 사업건의

□ 기대효과

- 미 급수지역에 수도시설 확충을 통하여 안전하고 깨끗한 상수도 공급함으로써 지역주민의 생활환경 및 보건위생환경 개선
- 지방상수도 공급을 통한 지역주민 생활불편 해소 및 물 복지 실현을 통한 삶의 질 향상 및 행정 신뢰도 향상

□ 위치도

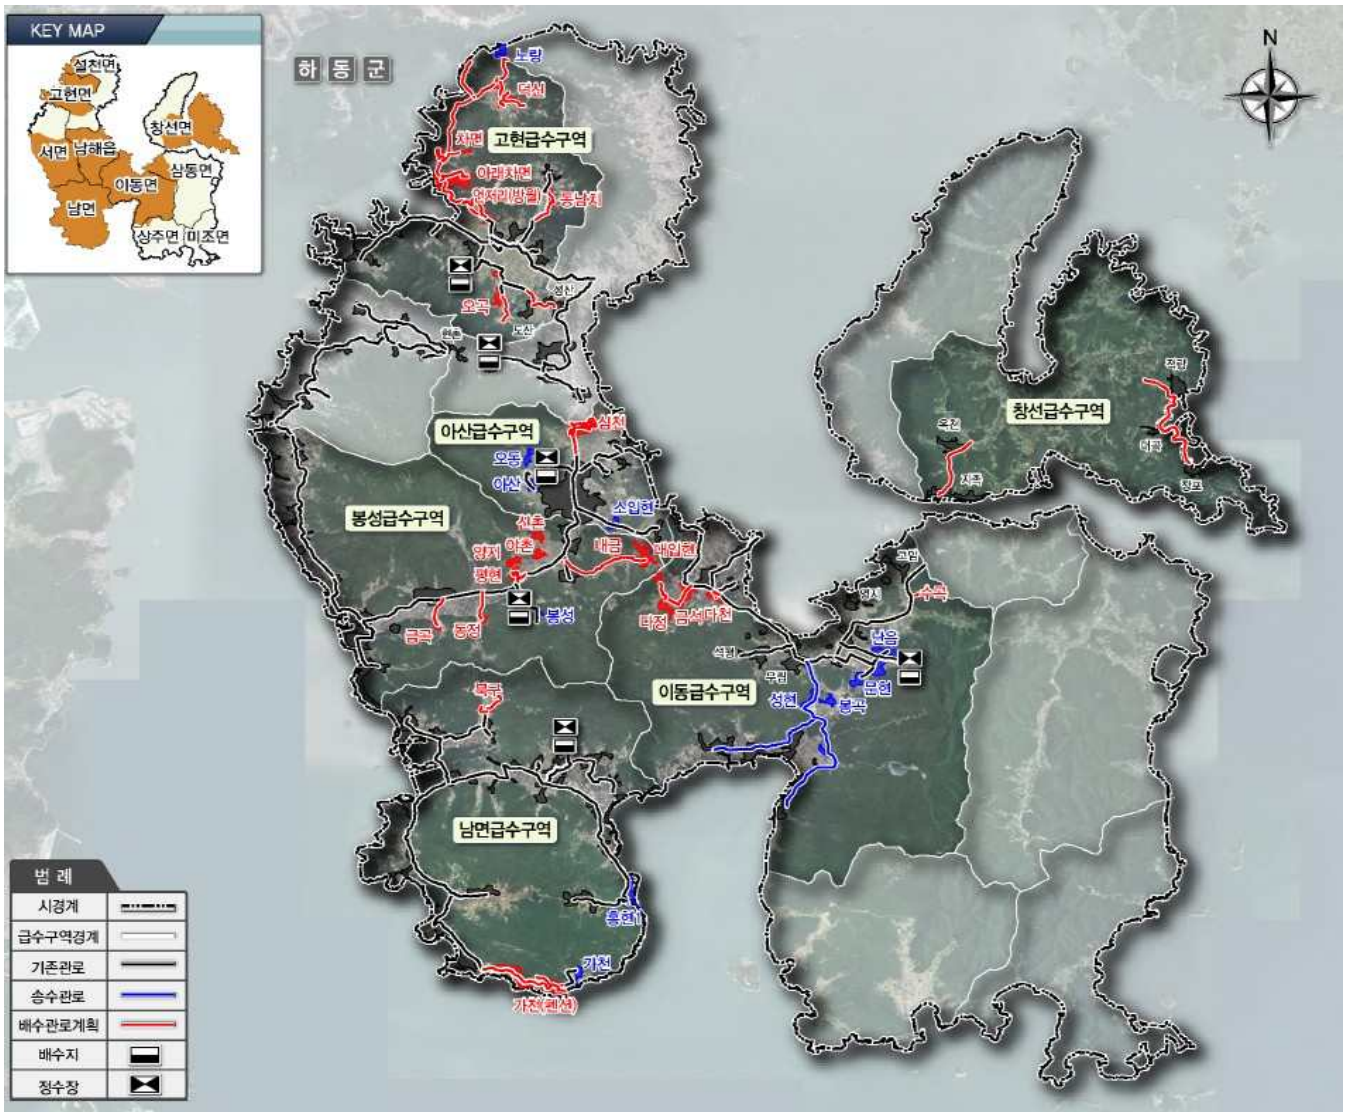

부서/팀	상하수도과 / 상수도팀	담당자	시설7급 신동평	전화번호	3324
------	--------------	-----	----------	------	------
